

第〇条 「週休 2 日制工事」の試行について

本工事は、高知市上下水道局「週休 2 日制工事」試行要領における■■工事である。
詳細については、下記に掲載する同要領を参照とすること。

高知市上下水道局技術監理課ホームページ

(<https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197/>)

なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位若しくは通期の現場閉所率（週休 2 日交替制工事の場合は、休日率）が 28.5%に満たない場合又は週休 2 日制工事が週休 2 日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。

※■■には、『週休 2 日制工事』又は『週休 2 日交替制工事』のいずれかを記入すること。

週休2日交替制工事へ変更の場合

別紙2
監督様式第3号

係	係長	課長補佐	工事課長
工事条件変更等確認要求書 令和〇年〇月〇日 高知市上下水道局 課長 様 (受注者) 〇〇建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 印 高知市工事請負契約書第18条第1項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。			
1 工 事 名	〇〇〇〇〇〇分区管渠築造工事(R〇-〇)		
2 工 事 場 所	高知市〇〇町		
3 工 期	令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月〇日		
4 変 更 事 項	高知市工事請負契約書第18条第1項第4号による。		
	具体的事項(必要に応じて図面、写真を添付して説明すること。) 特記仕様書第〇条の規定により「週休2日制工事」(月単位)とされているところですが、…(理由を記載)…のため「週休2日交替制工事」(月単位)を実施したいので、確認をお願いします。		
うえのことについては、次のとおり措置してください。 令和 〇年〇月〇日 (受注者) 〇〇建設株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 様 高知市上下水道局 課長 印			
5 変更事項に対する措置方法(図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く。) 上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に「週休2日交替制工事」(月単位)に対応した工程表を監督職員に提出してください。 (変更の必要性が認められない場合:上記事項について適当と認められませんので、特記仕様書に記載のとおり、施工計画書提出時に週休2日制工事(月単位)に対応した工程表を監督職員に提出して下さい。)			

注 受注者は「変更事項」までを記入したものを工事監督職員に2部提出する。

工事監督職員は、記入事項を確認のうえ「変更事項に対する措置事項」を回議、押印のうえ受注者に1部送付し、それぞれ相手方押印のあるものを1部づつ保管する。

週単位で実施の場合


別紙2-1
監督様式第3号

係		係長		課長補佐		工事課長	
工事条件変更等確認要求書							
令和〇年〇月〇日							
高知市上下水道局		課長 様					
(受注者) 〇〇建設株式会社							
代表取締役 〇〇 〇〇 印							
高知市工事請負契約書第18条第1項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。							
1 工 事 名	〇〇〇〇〇〇分区管渠築造工事(R〇-〇)						
2 工 事 場 所	高知市〇〇町						
3 工 期	令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月〇日						
4 変 更 事 項	高知市工事請負契約書第18条第1項第4号による。						
	具体的事項(必要に応じて図面、写真を添付して説明すること。) 特記仕様書第〇条の規定により「週休2日制工事」(週単位(完全週休2日(土日)))で実施したいので、確認をお願いします。						
うえのことについては、次のとおり措置してください。							
令和 〇年〇月〇日							
(受注者) 〇〇建設株式会社							
代表取締役 〇〇 〇〇 様							
高知市上下水道局				課長 印			
5 変更事項に対する措置方法(図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く。)							
上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に「週休2日制工事」(週単位(完全週休2日(土日)))に対応した工程表を監督職員に提出してください。 なお、請負代金額の変更対象とはなりません。							

注 受注者は「変更事項」までを記入したものを工事監督職員に2部提出する。

工事監督職員は、記入事項を確認のうえ「変更事項に対する措置事項」を回議、押印のうえ受注者に1部送付し、それぞれ相手方押印のあるものを1部ずつ保管する。

(掲示例)

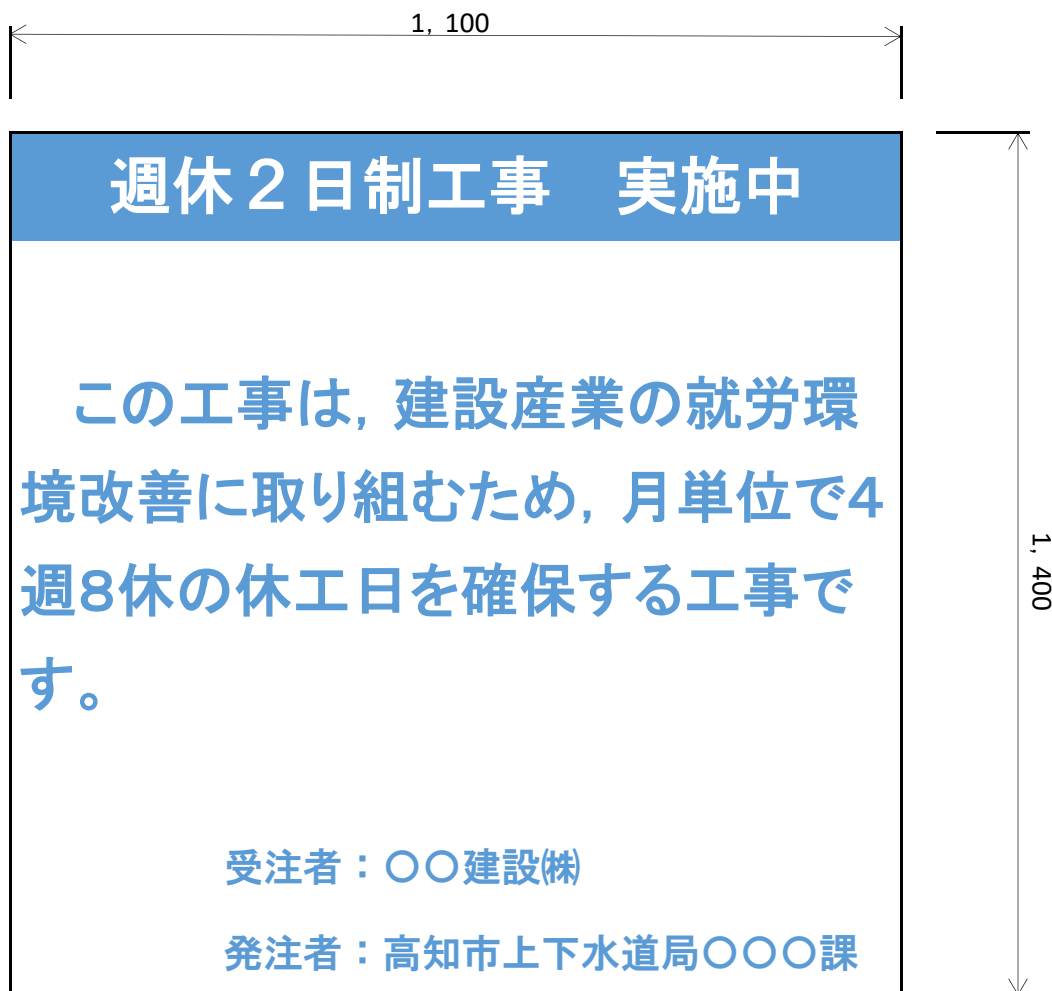

※受注者は、工事現場の見やすい位置にPR看板を設置するものとする。

※週休2日交替制工事の場合は、「週休2日交替制工事」と表示するなど、「交替制」であることを明示する。

※上記は掲示例であり、看板のサイズや文面を指定するものではない。

週休 2 日制工事における経費等の補正係数について

(土木工事)		週休 2 日制工事		週休 2 日交替制工事		
		現場閉所		交替制		
		通期	月単位	通期	月単位	
労務費※1		1.02	1.04	1.02	1.04	
機械経費(賃料)		1.02	1.02	—	—	
共通仮設費		1.02	1.03	—	—	
現場管理費		1.03	1.05	1.01	1.03	
市 場 単 価 (土 木 工 事 標 準 積 算 基 準)	鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
	ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
	インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	防護柵設置工 (ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	防護柵設置工 (ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.04	1.02	1.04
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
	防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.01	1.02
	道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
		撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
	道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
	吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.02	1.03	1.01	1.03
	道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
剪定		1.02	1.04	1.02	1.04	
公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04	
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02	
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04	

(土木工事)

		週休2日制工事		週休2日交替制工事		
		現場閉所		交替制		
		通期	月単位	通期	月単位	
	橋面防水工	1.01	1.01	1.01	1.01	
	薄層カラー舗装工	1.00	1.01	1.00	1.01	
	グルーピング工	1.00	1.01	1.00	1.01	
	軟弱地盤処理工	1.01	1.02	1.01	1.02	
	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	1.01	1.01	1.01	1.01	
土木 工事 標準 単価	区画線工	1.02	1.04	1.02	1.04	
	高視認性区画線工	1.02	1.04	1.02	1.04	
	橋梁塗装工	1.01	1.03	1.01	1.03	
	構造物とりこ わし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
		人力	1.02	1.04	1.02	1.04
	コンクリートブロック積工	1.02	1.04	1.02	1.03	
	排水構造物工	1.02	1.04	1.02	1.03	
	鋼製排水溝設置工	1.02	1.04	1.02	1.04	
	表面被覆工 (コンクリート 保護塗装)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
		高所作業車	1.01	1.02	1.01	1.02
	表面含侵工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
		高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
	連続繊維シー ト補強工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
		高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
	剥落防止工 (アラミド メッシュ)	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
		高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
	漏水対策材設 置工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
		高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
	防草シート設置工	1.01	1.03	1.01	1.03	
	紫外線硬化型 FRPシート設置 工(ポリエステル 樹脂)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
		高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
	塗膜除去工	1.02	1.04	1.02	1.04	
	バキュームブラスト工	1.01	1.01	1.00	1.01	
	道路反射鏡設 置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
		撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
	仮設防護柵設置工(仮設ガード レール)	1.02	1.04	1.02	1.04	
	機械式継手工	1.02	1.04	1.02	1.04	

(土木工事)

		週休2日制工事		週休2日交替制工事		
		現場閉所		交替制		
		通期	月単位	通期	月単位	
	抵抗板付鋼製基礎工	1.02	1.03	1.01	1.02	
	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工	1.01	1.01	1.01	1.01	
	FRP製格子状パネル設置工	1.00	1.00	1.00	1.00	
	浸食防止用植生マット工(養生マット工)	1.02	1.04	1.02	1.04	
	支承金属容射工	1.02	1.04	1.02	1.04	
	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工	1.02	1.03	1.02	1.03	
市場単価 (下水道用設計標準係表)	硬質塩化ビニル管設置工	1.01	1.02	1.01	1.02	
	リブ付硬質塩化ビニル管	1.01	1.02	1.01	1.02	
	砂基礎工	人力施工	1.02	1.04	1.02	1.04
		機械施工	1.02	1.04	1.02	1.04
	碎石基礎工	人力施工	1.02	1.04	1.02	1.04
		機械施工	1.02	1.04	1.02	1.04
	組立マンホール設置工	1.02	1.03	1.01	1.03	
	小型マンホール工	1.00	1.01	1.00	1.01	
	取付管および ます設置工	ます設置工	1.00	1.01	1.00	1.01
		取付管布設及び 支管取付工	1.01	1.02	1.01	1.02

※1 週休2日の補正対象は、公共工事設計労務単価(51職種)、船団長、潜水世話役、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工とし、それ以外の労務単価については補正対象外とする。また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対象外とする。

※2 4週8休以上：現場閉所率又は休日率 28.5%以上

現場閉所率又は休日率は次式により算出する。

現場閉所率=対象期間内の現場閉所日数/対象期間内の日数×100(%)

休日率=対象期間内の休日総数/対象期間内の総日数×100(%)

※小数点第2位を切り捨てる。

※対象期間は要領第3条による。

※休日率は、施工体制台帳上に記載の必要がない場合(建設工事の請負契約に該当しない等)、経費の補正対象でない場合、現場施工が7日未満の場合等は、算出の対象としない。

